

รายงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลชุมชนพรเขตอุดมศักดิ์

กลุ่มงานพัสดุ





รายงานความก้าวหน้า
การจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
- สิ่งก่อสร้าง


ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

งบประมาณ

รายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ


ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินกันปี 2563)

- 15.บริหารสัญญา
- 14.ส่งสำเนาสัญญา
- 13. ลงนามในสัญญา
- 12.เว้นระยะอุรรณ
- 11.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
- 10. อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- 9.การพิจารณาเสนอราคา
- 8.ผู้เสนอราคาเสนอราคา
- 7.กำหนดวันชี้แจง
- 6.ส่งประกาศ
- 5.เผยแพร่ประกาศ
- 4.จัดทำรายงานเผยแพร่
- 3.จัดทำรายงานขอซื้อ
- 2.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- 1.จัดทำแผนจัดซื้อ




ส่งมอบงานงวดที่ 4

แพลตฟอร์มพยาบาล
7 ชั้น 40 ยูนิต



แฟลตพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต
 เริ่มสัญญา 9 มีนาคม 2564
 สิ้นสุด 22 กรกฎาคม 2565

รวมงบ 52,970,000 บาท
 เบิกจ่ายแล้ว 9,004,900 บาท



ผลงานความก้าวหน้า 25.60 %
 ช้ากว่าแผน 74.70 %
 ระยะเวลาดำเนินการ 500 วัน
 ดำเนินการมาแล้ว 447 วัน
 คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง 53 วัน


งวดงาน	งวดเงิน	ตามแผนในสัญญา	ตามแผนคาดการณ์ใหม่	ส่งงานจริง	เบิกจ่าย(จริง)	ระยะล่าช้ากว่าแผน
1	2,648,500.00	28 เม.ย. 64	23 ก.ย. 64	23 ก.ย. 64	2,648,500.00	เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ล่าช้ากว่าแผนคิดเป็น 74.40%
2	2,118,800.00	28 พ.ค. 64	7 ก.พ. 65	23 ก.พ. 65	2,118,800.00	
3	2,118,800.00	27 มิ.ย. 64	18 มี.ค. 65	18 มี.ค. 65	2,118,800.00	
4	2,118,800.00	27 ก.ค. 64	30 เม.ย. 65	5 พ.ค. 65	2,118,800.00	
5	2,648,500.00	26 ส.ค. 64	15 มิ.ย. 65	-	0	
6	2,648,500.00	25 ก.ย. 64	31 ก.ค. 65	-	0	
7	2,118,800.00	25 ต.ค. 64	31 ส.ค. 65	-	0	
8	1,589,100.00	24 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65	-	0	
9	1,589,100.00	24 ธ.ค. 64	31 ต.ค. 65	-	0	
10	1,589,100.00	2 ก.พ. 65	31 ต.ค. 65			
11	3,178,200.00	14 มี.ค. 65	30 พ.ย. 65			
12	7,945,500.00	23 เม.ย. 65	30 พ.ย. 65			
13	9,004,900.00	2 มิ.ย. 65	25 ธ.ค. 65			
14	11,653,400.00	22 ก.ค. 65	25 ธ.ค. 65			

งบประมาณ

รายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบผูกพัน)

- 15.บริหารสัญญา
- 14.ส่งสำเนาสัญญา
- 13. ลงนามในสัญญา
- 12.เว้นระยะอุธรณ์
- 11.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
- 10. อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- 9.การพิจารณาเสนอราคา
- 8.ผู้เสนอราคาเสนอราคา
- 7.กำหนดวันชี้แจง
- 6.ส่งประกาศ
- 5.เผยแพร่ประกาศ
- 4.จัดทำรายงานเผยแพร่
- 3.จัดทำรายงานขอซื้อ
- 2.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- 1.จัดทำแผนจัดซื้อ



ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น

ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 20 พ.ค. 65



งวดงาน	งวดเงิน	ตามแผนในสัญญาแล้วเสร็จ	ตามแผนคาดการณ์ใหม่	ส่งงานจริง	เบิกจ่าย(จริง)	ระยะล่าช้ากว่าแผน
1	4,792,796.00	16 ก.ค. 64	20 มี.ค. 65	20 พ.ค. 65	3,813,480.43	เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันล่าช้ากว่าแผน 84.50%
2	2,512,728.00	25 ส.ค. 64	20 เม.ย. 65	-	0	
3	1,954,344.00	1 ต.ค. 64	20 พ.ค. 65	-	0	
4	2,605,792.00	13 พ.ย. 64	20 มิ.ย. 65	-	0	
5	2,838,452.00	23 ธ.ค. 64	20 ก.ค. 65	-	0	
6	3,210,708.00	1 ก.พ. 65	15 ส.ค. 65	-	0	
7	2,233,536.00	13 มี.ค. 65	20 ก.ย. 65	-	0	
8	3,024,580.00	22 เม.ย. 65	30 ต.ค.65	-		
9	5,490,776.00	1 มิ.ย. 65	10 ธ.ค.65	-		
10	8,748,016.00	21 ก.ย. 65	20 ม.ค. 66	-		
11	9,120,272.00	9 ก.ย. 65	28 ก.พ. 66	-		

อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
เริ่มสัญญา 26 เมษายน 2564
สิ้นสุด 9 กันยายน 2565

รวมงบประมาณ 46,532,000.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 3,813,480.43 บาท



ผลงานความก้าวหน้า 15.50 %
ช้ากว่าแผน 84.50 %
ระยะเวลาดำเนินการ 500 วัน
ดำเนินการมาแล้ว 399 วัน
คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง 101 วัน

วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ระยะเวลาสัญญา	เริ่มดำเนินการจริงของผู้รับจ้าง	ปัญหาความล่าช้า	หมายเหตุ
1. แพลตฟักรักษาพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต	9 มี.ค.64 – 22 ก.ค.65	10 มี.ค.64 - ปัจจุบัน	1.ผรจ.มีปัญหาเรื่องจัดหาแรงงาน ในช่วงโควิด การย้ายแรงงานข้ามจังหวัด และการฉีดวัคซีน 2. ช่วงเดือนเมษายน แรงงานที่ทำงานติดโควิด เกือบทั้งไซต์งานก่อสร้าง มีผลต้องกักตัว ทำให้ส่งงานได้ปลายเดือนเมษายน	1.ปัจจุบัน ผรจ.ส่งมอบงานถึงงวดงานที่ 1-4 แล้วเสร็จ 2.ผรจ.วางแผนส่งงวดงานที่ 5 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 3.ผรจ.วางแผนเร่งรัดงานใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ไปประมาณ 5 เดือน

วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต


MASTER PROJECT SCHEDULE & S - CURVE โครงการก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง)

แก้ไขครั้งที่ 2
วันที่ 9 ธันวาคม 2565



โครงการ : แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (80 ห้อง โครงการสร้างด้วยเงินกู้)
 ผู้ว่าจ้าง : โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
 ผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็มพีซี พิวเจอร์ อินชามอเตอร์ เซฟท์ จำกัด
 สถานที่ยกย่องจ้าง : 222 ม.พหลโยธินพลาซ่า อ.พหลโยธิน จ.พิษณุโลก 66000

หมายเหตุ: 1) เมื่อพิจารณาจากภาพหน้าหน้า 19 ของแบบพิมพ์
 2) ค่าใช้จ่ายรวมรวมการดำเนินงานทั้งหมด

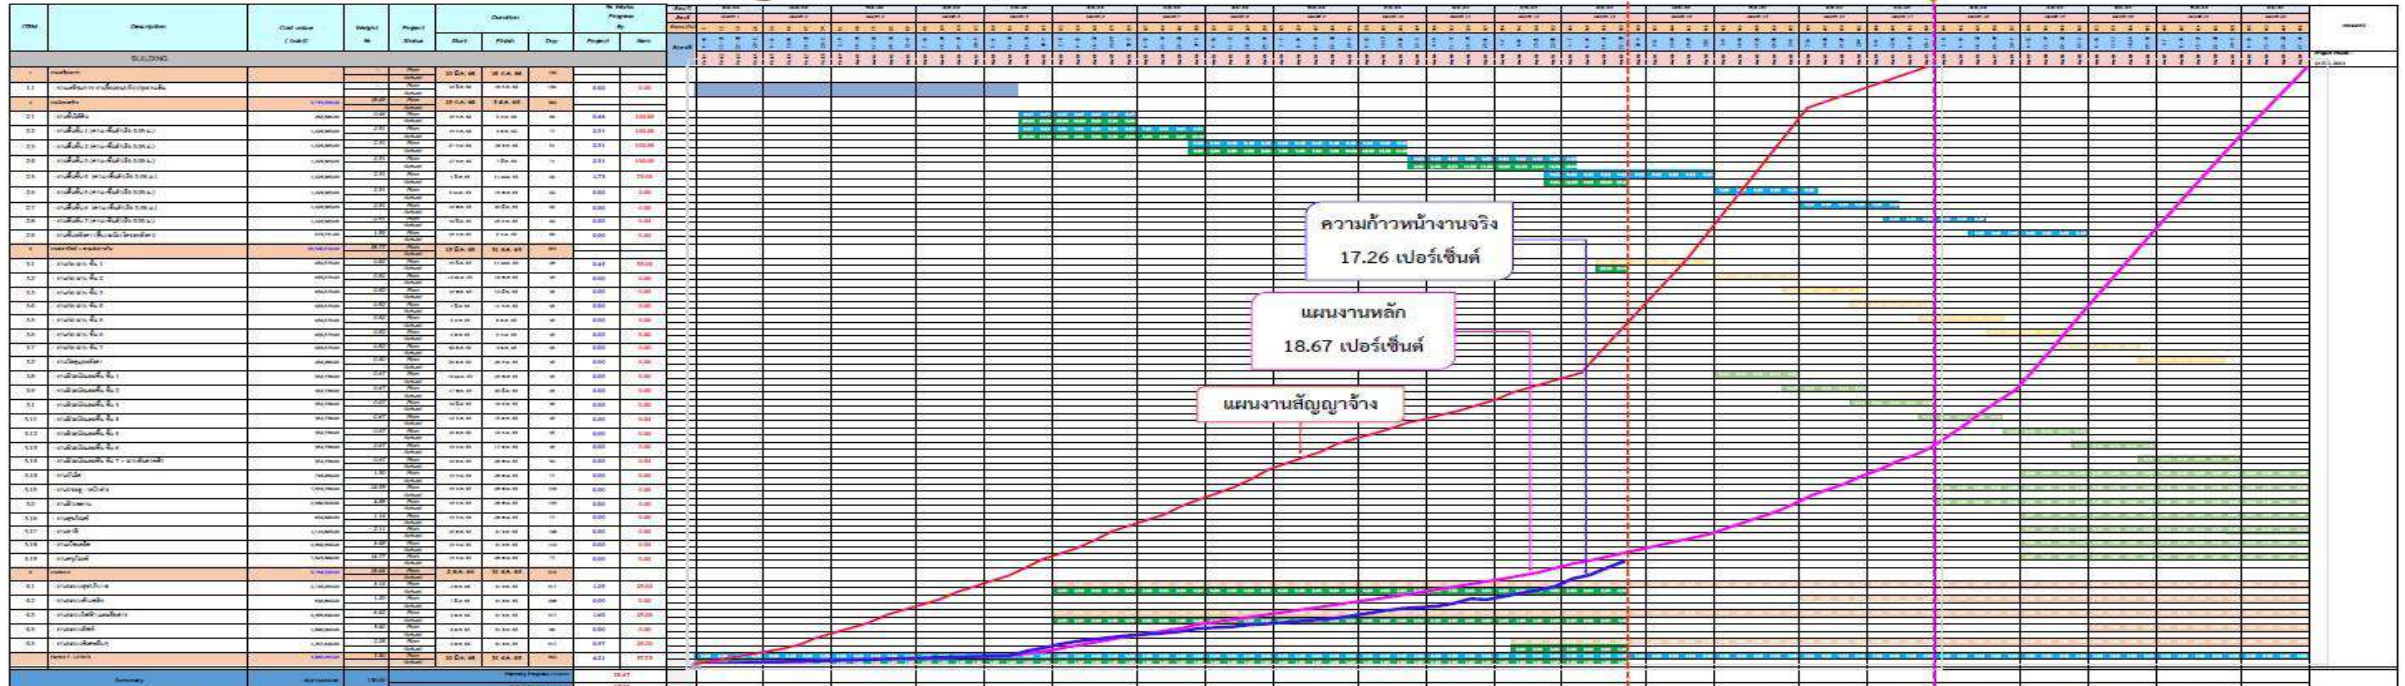

ID	ชื่อกิจกรรม	สถานะ	วันที่เริ่ม	วันที่จบ	ระยะเวลา	Planning - % Work Progress (Per Month)	
						Actual	Plan
1	ปิดไม่ทำอะไร	ไม่ทำอะไร	01/01/2024	31/12/2024	365	0%	0%
2	เตรียมงานเบื้องต้น	เสร็จ	01/01/2024	31/01/2024	31	100%	100%
3	ขออนุญาตก่อสร้าง	เสร็จ	01/01/2024	31/01/2024	31	100%	100%
4	ขออนุญาตใช้ที่ดิน	เสร็จ	01/01/2024	31/01/2024	31	100%	100%
5	ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง	เสร็จ	01/01/2024	31/01/2024	31	100%	100%
6	นำสัญญาจ้างก่อสร้าง	เสร็จ	01/01/2024	31/01/2024	31	100%	100%
7	ดำเนินการจ้าง/นำแบบมาดำเนินการ	เสร็จ	01/01/2024	31/01/2024	31	100%	100%

รายละเอียดแสดงข้อมูล

- ความก้าวหน้างานจริง
- แผนงานสัญญาจ้าง
- แผนงานหลัก
- ผลงานที่ทำได้จริง

วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต



รูปภาพประกอบการทำงานแล้วเสร็จงวดงานที่ 1-3

วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง แพลตฟอร์มพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต

ภาพประกอบการทำงาน : งานงวดที่ 4
พรจ.ส่งมอบงาน (งวดที่ 4) เรียบร้อยแล้ว



รูปภาพงานเทพื้นชั้นที่ 4



รูปภาพงานวางบันไดชั้นที่ 4

วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง แพลตฟอร์มพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต



รูปภาพงานเหล็กผนังชั้น 4



รูปภาพงานเทพนั่งชั้น 4

วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง แฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต



รูปภาพงานก่อผนังชั้นที่ 1




รูปภาพงานท่อระบบสุขาภิบาลชั้นที่ 1

วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ระยะเวลาสัญญา	เริ่มดำเนินการจริงของผู้รับจ้าง	ปัญหาความล่าช้า	หมายเหตุ
2. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น	17 พ.ค.64 – 9 ก.ย.65	18 พ.ค.64 - ปัจจุบัน	1.มีการปรับผังการก่อสร้าง ช่วง พ.ค.-ปลายเดือนสิงหาคม 2.งานเอกสารขออนุญาตผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เอกสารไม่ครบ ทำให้เกิดการล่าช้า 3.ปัญหาเรื่องการทำงานช่วงเดือน เมษายน มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้การทำงานเกิดการล่าช้า	1.พรจ. ส่งงวดงานที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น

ความก้าวหน้าโดยรวมของโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

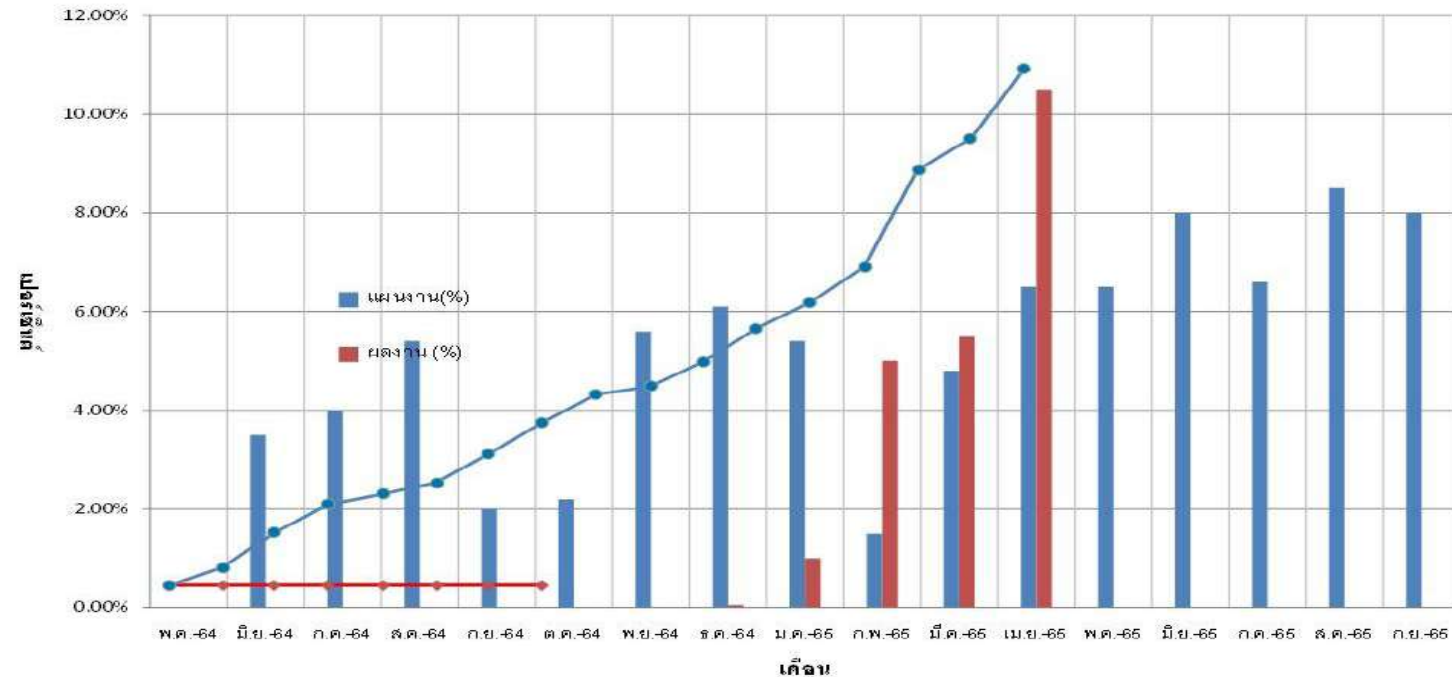

ความก้าวหน้าโดยรวม		พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65							
แผนงาน (%)	รายละเอียด	0.00%	3.50%	4.00%	5.40%	6.00%	6.20%	6.60%	6.90%	7.50%	8.00%	8.50%	9.00%	9.50%	10.00%	10.50%	10.80%	11.00%							
	สะสม	0.00%	3.50%	10.30%	15.70%	17.70%	19.90%	25.50%	31.60%	37.00%	38.50%	43.30%	49.80%	54.80%	61.60%	69.40%	86.80%	100.00%							
ผลงาน (%)	รายละเอียด	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	1.00%	5.00%	5.50%	10.50%													
	สะสม	0.00%	0.00%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	1.00%	5.00%	5.00%	10.50%													

02 - 5

ปัญหาความล่าช้า


1. มีการปรับผังการก่อสร้างช่วง พ.ค.-ปลายเดือนสิงหาคม
2. งานเอกสารขออนุมัติผลทดสอบดินส่งเอกสารไม่ครบ ทำให้เกิดการล่าช้า

วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น

ทางผู้รับจ้างส่งงานงวดงานที่ 1 10.3% ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

- 1.1 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง
- 1.2 วางผัง
- 1.3 ทอสอบดิน
- 1.4 ทำงานเสาเข็ม
- 1.5 ก่อสร้างฐานราก , หล่อเสาตอม่อ
- 1.6 หล่อถังเก็บน้ำใต้ดิน , บ่อลิฟท์


วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น

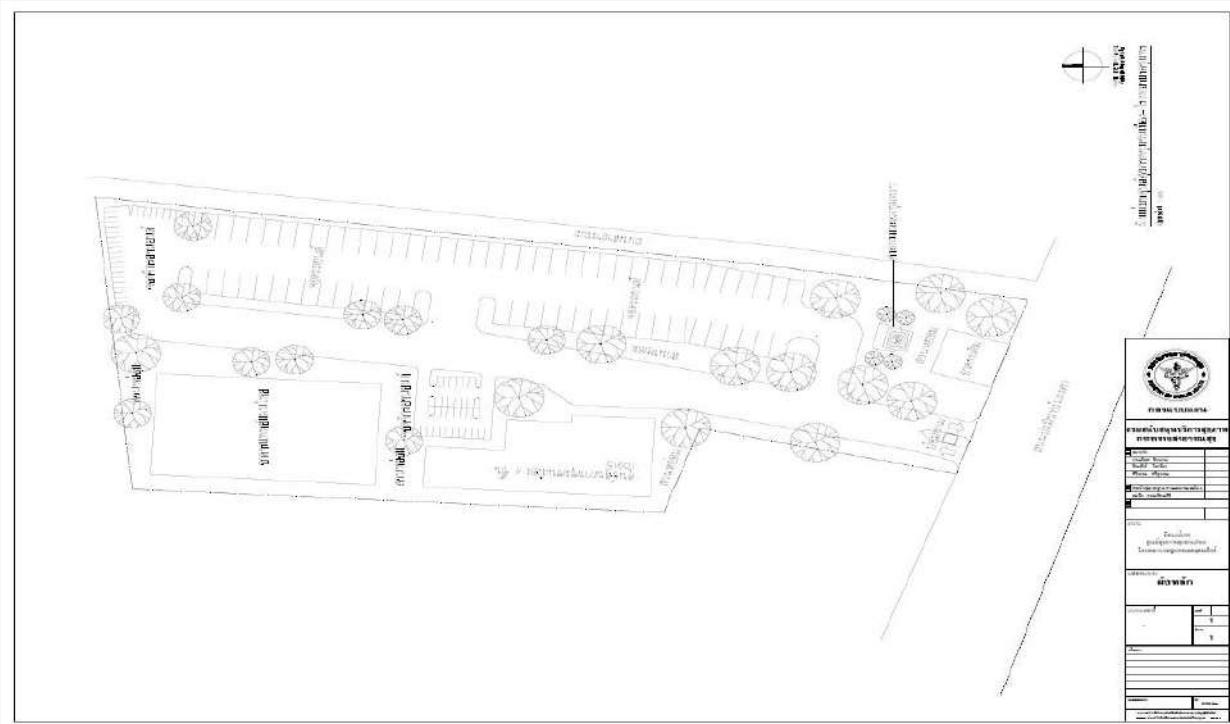

รูปภาพการปรับวางผังเว้นระยะ 6.00 ม.จากรั้ว

16 มิย. 2564 ประชุมครั้งที่ 2 มีมติอนุมัติใช้ผัง เว้นระยะ 6.00 ม.จากรั้ว

วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น

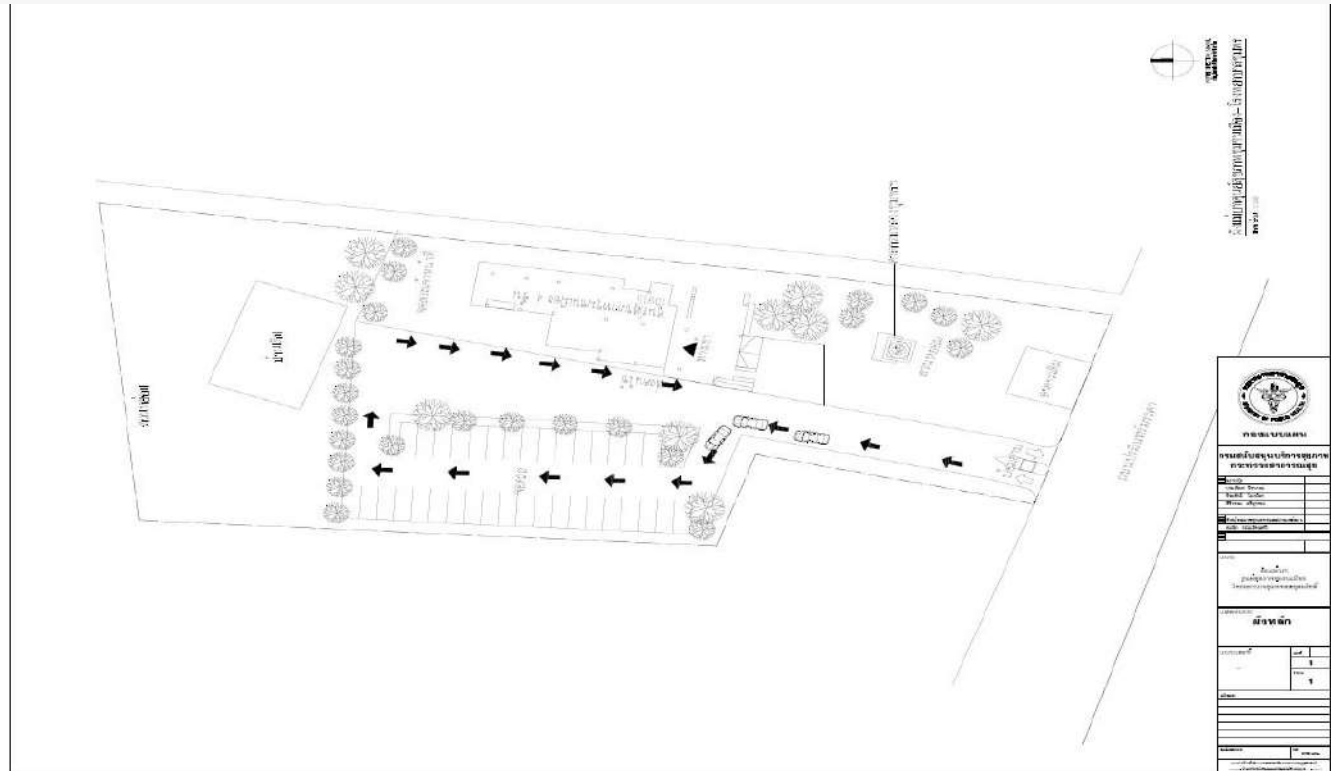

รูปภาพการปรับวางผังใหม่ วันที่ 2 กค.2564

วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น



รูปภาพการผังบริเวณแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม



รูปภาพการวางผังโครงการ



รูปภาพการทดสอบเสาเข็ม



รูปภาพการก่อสร้างฐานราก



รูปภาพเตรียมงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน-บ่อลิฟท์

วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น



รูปภาพ งานเหล็กถักเก็บน้ำใต้ดิน



รูปภาพ หล่อถักเก็บน้ำใต้ดิน

วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น



รูปภาพ งานก่อสร้างบ่อลิฟท์ อยู่ในงวดงานที่ 1



รายงานความก้าวหน้า การจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

- ครุภัณฑ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

งบประมาณ

รายการครุภัณฑ์ งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2565 (e-bidding) 1 รายการ

15.บริหารสัญญา

14.ส่งสำเนาสัญญา

13. ลงนามในสัญญา

12.เว้นระยะอุธรณ์

11.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

10. อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

9.การพิจารณาเสนอราคา

8.ผู้เสนอราคาเสนอราคา

7.กำหนดวันชี้แจง

6.ส่งประกาศ

5.เผยแพร่ประกาศ

4.จัดทำรายงานเผยแพร่

3.จัดทำรายงานขอซื้อ

2.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

1.จัดทำแผนจัดซื้อ

ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

เครื่อง X'Ray ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบ
แขวนเพดานดิจิทัล 1 จอรับภาพ

งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 11 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคารวม
1	เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน	1	3,500,000.-
2	โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี	1	1,450,000.-
3	ยูนิตทำฟัน	2	920,000.-
4	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	6	900,000.-
5	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง	1	800,000.-
6	กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก	1	730,000.-
7	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้	1	450,000.-
8	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (Pre-Post Vac)	1	300,000.-
9	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้	1	175,000.-
10	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่าเอ 4	1	120,000.-
11	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	1	55,000.-

งบค่าเสื่อม

รายการครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม

ประจำปีงบประมาณ 2565 (e-bidding) 6 รายการ



1. เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน จำนวน 1 เครื่อง (ส่งมอบและเบิกเงินแล้ว)
2. เครื่องช่วยหายใจในชนิดควบคุมด้วยปริมาตร ลดความดัน ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง (ส่งมอบและเบิกเงินแล้ว)
3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 6 เครื่อง (ส่งมอบและเบิกเงินแล้ว)
4. ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง (ส่งมอบและเบิกเงินแล้ว)
5. กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก จำนวน 1 เครื่อง (รอส่งมอบ)
6. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง (รอส่งมอบ)

งบค่าเสื่อม

รายการครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม

ประจำปีงบประมาณ 2565 (วิธีเฉพาะเจาะจง) 5 รายการ

10.บริหารสัญญา

9.ส่งสำเนาสัญญา

8. ลงนามในสัญญา

7.เรียกลงนามในสัญญา

6.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

5. อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

4.ผู้เสนอราคาเสนอราคา

3.จัดทำรายงานขอซื้อ

2. จัดทำรายงานสเปคฯ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง (รอส่งมอบ)

2. ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง (ส่งมอบพัสดุแล้ว)

3. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าเอ 4 จำนวน 6 เครื่อง (ส่งมอบพัสดุแล้ว)

4. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 1 เครื่อง (ส่งมอบพัสดุแล้ว)

5 เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (Pre-Post Vac) จำนวน 1 เครื่อง (ลงนามสัญญาแล้วรอส่งมอบ)

งบเงินกู้โควิดฯ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคารวม
1	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง	5	17,950,000.-
2	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 300 mA.	2	10,276,000.-
3	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลชนิดน้ำหนักเบา	2	7,000,000.-
4	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	20	4,000,000.-
5	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง	2	1,598,000.-
6	กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ	1	999,000.-

งบเงินกู้

รายการครุภัณฑ์ งบเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (e-bidding)

อำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จำนวน 2 รายการ

	Timeline เดิม	Timeline ใหม่ มีวิจารณ์ร่างประกาศประกวดฯ ครั้งที่ 2
15.บริหารสัญญา		
14.ส่งสำเนาสัญญา		
13. ลงนามในสัญญา (1 วัน)	29/เม.ย/65	11/ก.ค/65
12.เว้นระยะอุทธรณ์ (7 วัน)	19-27/เม.ย/65	27 มิ.ย -1 ก.ค/65
11.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (3 วัน)	11-18/เม.ย/65	22 มิ.ย- 24 มิ.ย./65
10. อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง		
9.การพิจารณาเสนอราคา	1-8/เม.ย/65	15-21/มิ.ย./65
8.ผู้เสนอราคาเสนอราคา	31/มี.ค/65	14/มิ.ย./65
7.กำหนดวันชี้แจง		
6.ส่งประกาศ/เอกสารฯ สดง.		
5. เผยแพร่ประกาศ (3 วัน)	28-30/มี.ค/65	9-13/มิ.ย./65
4.จัดทำรายงานเผยแพร่	23-25/มี.ค/65	7-8/มิ.ย./65
3.1 กรณีเผยแพร่ร่างประกาศ (3 วัน)	18-22/มี.ค/65	1 มิ.ย.- 6 มิ.ย./65
3.จัดทำรายงานขอซื้อ	17-18/มี.ค/65	
2.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ	10-16/มี.ค/65	
1.จัดทำแผนจัดซื้อ	9/มี.ค/65	

1. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ 5 เครื่อง

ยกเลิกประกาศเชิญชวน 27 พ.ค. และ ทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลาง ดำเนินการประกาศใหม่

2. เครื่อง X'Ray เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 300 mA 2 เครื่อง

ดำเนินการเรียกทำสัญญา

งบเงินกู้

รายการครุภัณฑ์ **งบเงินกู้** ประจำปีงบประมาณ 2565 (e-bidding) อำนาจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 4 รายการ

15.บริหารสัญญา	
14.ส่งสำเนาสัญญา	
13. ลงนามในสัญญา (1 วัน)	18/เม.ย/65
12.เว้นระยะอุทธรณ์ (7 วัน)	1-12/เม.ย/65
11.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา	31/มี.ค./65
10. อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	30/มี.ค/65
9.การพิจารณาเสนอราคา (5)	23-29/มี.ค/65
8.ผู้เสนอราคาเสนอราคา	22/มี.ค/65
7.กำหนดวันชี้แจง	
6.ส่งประกาศ/เอกสารฯ สดง.	
5. เผยแพร่ประกาศ (3 วัน)	16-21/มี.ค/65
4.จัดทำรายงานเผยแพร่	11-15/มี.ค/65
3.1 กรณีเผยแพร่ร่างประกาศ (3 วัน)	
3.จัดทำรายงานขอซื้อ	11-15/มี.ค/65
2.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ	10/มี.ค/65
1.จัดทำแผนจัดซื้อ	9/มี.ค/65

1. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง
จำนวน 20 เครื่อง (รอส่งมอบพัสดุ)

2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
และความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง (รอส่งมอบพัสดุ)

3 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน 2 เครื่อง

4 กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้
ชนิดวีดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ
เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจ
และใส่ท่อหายใจ จำนวน 1 เครื่อง

ลงนามในสัญญา รอส่งมอบ

ลงนามในสัญญา วันที่ 25 พ.ค. 65 รอส่งมอบ
