


รายงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

กลุ่มงานพัสดุ





รายงานความก้าวหน้า  
การจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  
- สิ่งก่อสร้าง


ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

# งบประมาณ

รายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ


ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินกันปี 2563)

- 15.บริหารสัญญา
- 14.ส่งสำเนาสัญญา
- 13. ลงนามในสัญญา
- 12.เว้นระยะอุธรณ์
- 11.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
- 10. อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- 9.การพิจารณาเสนอราคา
- 8.ผู้เสนอราคาเสนอราคา
- 7.กำหนดวันชี้แจง
- 6.ส่งประกาศ
- 5.เผยแพร่ประกาศ
- 4.จัดทำรายงานเผยแพร่
- 3.จัดทำรายงานขอซื้อ
- 2.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- 1.จัดทำแผนจัดซื้อ

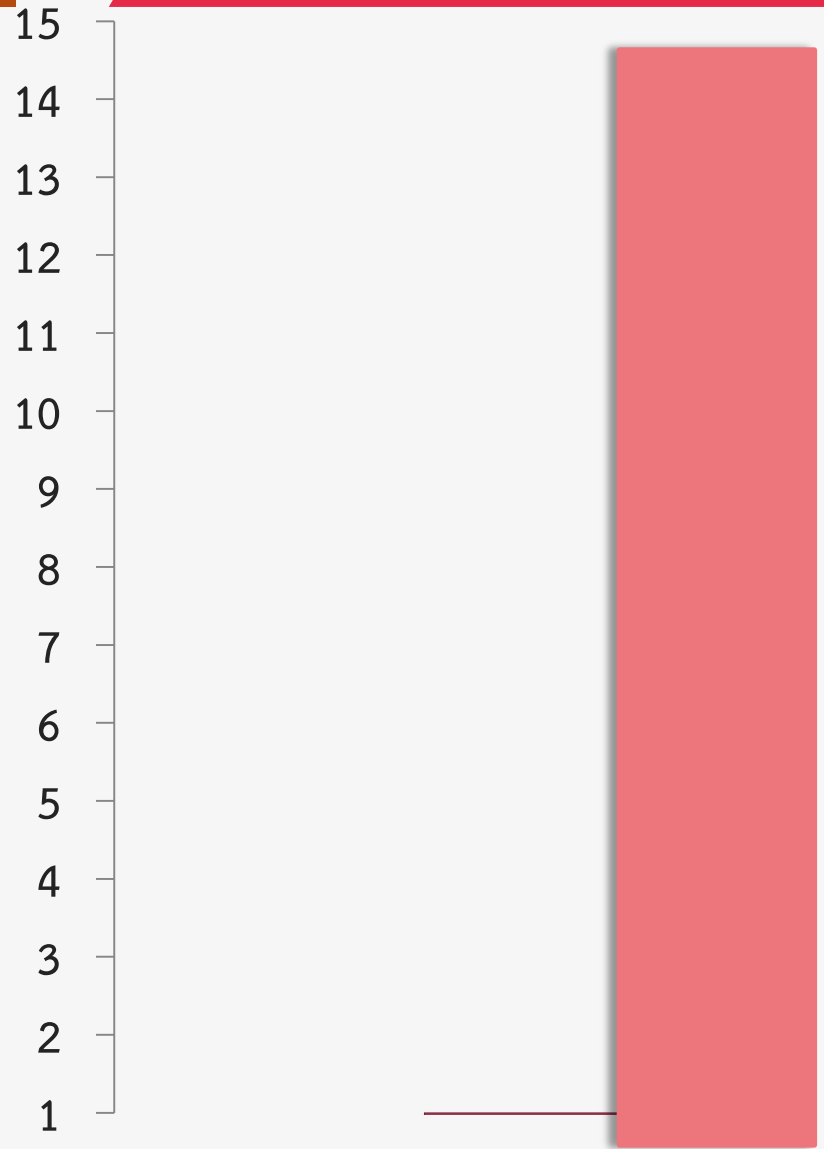


แพลตฟอร์มพยาบาล  
7 ชั้น 40 ยูนิต

ส่งมอบงานงวดที่ 5 วันที่ 16 มิ.ย. 65



แฟลตพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต  
 เริ่มสัญญา 9 มีนาคม 2564  
 สิ้นสุด 22 กรกฎาคม 2565

รวมงบ 52,970,000 บาท  
 เบิกจ่ายแล้ว 11,653,400 บาท



ผลงานความก้าวหน้า 30.01 %  
 ช้ากว่าแผน 69.99 %  
 ระยะเวลาดำเนินการ 500 วัน  
 ดำเนินการมาแล้ว 500 วัน  
 คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง 0 วัน

งวดงาน	งวดเงิน	ตามแผนในสัญญา	ตามแผนคาดการณ์ใหม่	ส่งงานจริง	เบิกจ่าย(จริง)	ระยะล่าช้ากว่าแผน
1	2,648,500.00	28 เม.ย. 64	23 ก.ย. 64	23 ก.ย. 64	2,648,500.00	เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ล่าช้ากว่าแผนคิดเป็น 69.99%
2	2,118,800.00	28 พ.ค. 64	7 ก.พ. 65	23 ก.พ. 65	2,118,800.00	
3	2,118,800.00	27 มิ.ย. 64	18 มี.ค. 65	18 มี.ค. 65	2,118,800.00	
4	2,118,800.00	27 ก.ค. 64	30 เม.ย. 65	5 พ.ค. 65	2,118,800.00	
5	2,648,500.00	26 ส.ค. 64	15 มิ.ย. 65	16 มิ.ย. 65	2,648,500.00	
6	2,648,500.00	25 ก.ย. 64	31 ก.ค. 65	-	0	
7	2,118,800.00	25 ต.ค. 64	31 ส.ค. 65	-	0	
8	1,589,100.00	24 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65	-	0	
9	1,589,100.00	24 ธ.ค. 64	31 ต.ค. 65	-	0	
10	1,589,100.00	2 ก.พ. 65	31 ต.ค. 65			
11	3,178,200.00	14 มี.ค. 65	30 พ.ย. 65			
12	7,945,500.00	23 เม.ย. 65	30 พ.ย. 65			
13	9,004,900.00	2 มิ.ย. 65	25 ธ.ค. 65			
14	11,653,400.00	22 ก.ค. 65	25 ธ.ค. 65			

# วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ระยะเวลาสัญญา	เริ่มดำเนินการจริงของผู้รับจ้าง	ปัญหาความล่าช้า	หมายเหตุ
๑. แพลตพักพยาบาล ๗ ชั้น ๔๐ ยูนิต	๙ มี.ค.๖๔ - ๒๒ ก.ค.๖๕	๑๐ มี.ค.๖๔ - ปัจจุบัน	-	๑.ปัจจุบัน ผรจ.ส่งมอบงานถึงงวดงานที่ ๑-๕ แล้วเสร็จ ๒.ผรจ.วางแผนส่งงวดงานที่ ๖ ภายในเดือนสิงหาคม ๓.ผรจ.วางแผนเร่งรัดงานใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ไปประมาณ ๕ เดือน




# วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง แพลตฟอร์มพยาบาล ๗ ชั้น ๔๐ ยูนิต



โครงการ : วัตถุประสงค์พยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต (30 ห้อง โครงการฯ) ชั้นบนสุด  
 ผู้ว่าจ้าง : บริษัท อีซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 สถานที่ก่อสร้าง : 222 อ.สีหราชพัฒนา อ.สีหราชพัฒนา จ.สมุทรสาคร 16100

MSA/CBS PROJECT SCHEDULE S-C-CURVE โครงการก่อสร้างอาคารพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต 490 วัน

วันที่ : 15/06/2561

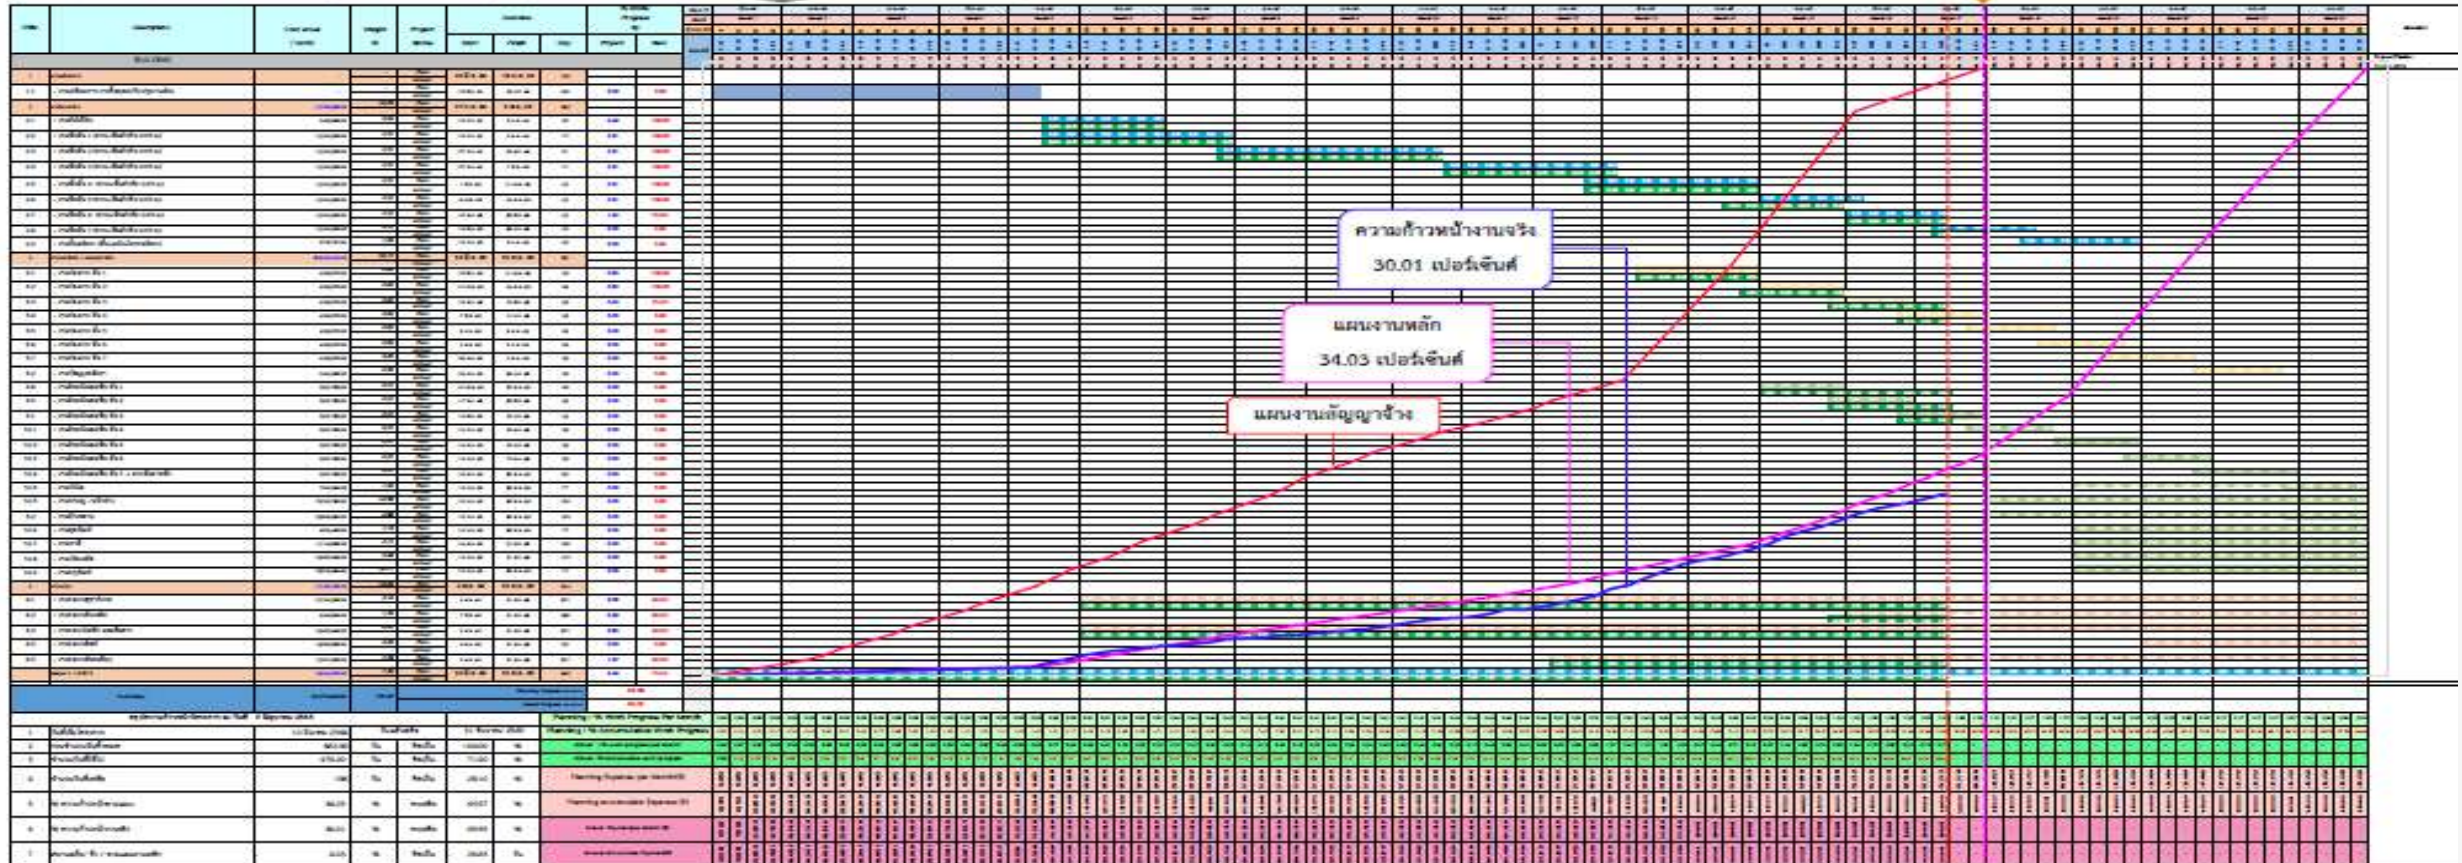

งานที่มอบหมายโดยผู้ว่าจ้าง

- แผนงานัญญาจ้าง
- แผนงานหลัก
- ผลงานที่ดำเนินการ

Activity	Start	End	Duration	Progress
1. อนุมัติโครงการ	01/01/2561	01/01/2561	1	100%
2. อนุมัติแบบก่อสร้าง	01/01/2561	01/01/2561	1	100%
3. อนุมัติสัญญา	01/01/2561	01/01/2561	1	100%
4. อนุมัติแบบวิศวกรรม	01/01/2561	01/01/2561	1	100%
5. อนุมัติแบบสถาปัตย์	01/01/2561	01/01/2561	1	100%
6. อนุมัติแบบ MEP	01/01/2561	01/01/2561	1	100%
7. อนุมัติแบบ 3D rendering	01/01/2561	01/01/2561	1	100%

# วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง แพลตฟอร์มพยาบาล ๗ ชั้น ๔๐ ยูนิต

ปริมาณ รวม	วันที่ 10/03/64 – 20/7/65		
	ความก้าวหน้าแผนตามสัญญา (%)	ความก้าวหน้าตามแผน ผ.ร.จ. (%)	ความก้าวหน้าตามงานจริง (%)
	100	34.03	30.01

# วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง แพลตฟอร์มพยาบาล ๗ ชั้น ๔๐ ยูนิต



สรุปความก้าวหน้าโครงการ

รูปภาพประกอบการทำงานงวดงานที่ 6



# วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง แพลตฟอร์มพยาบาล ๗ ชั้น ๔๐ ยูนิต

ภาพประกอบการทำงาน : งานงวดงานที่ 6  
พรจ.วางแผนส่งมอบงวดงานภายในเดือนสิงหาคม



รูปภาพงานพื้นชั้นที่ 6



รูปภาพงานเสาชั้นที่ 6

# วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง แพลตฟอร์มพยาบาล ๗ ชั้น ๔๐ ยูนิต

ภาพประกอบการทำงาน : งานงวดงานที่ 6

พรจ.วางแผนส่งมอบงวดงานภายในเดือนสิงหาคม



รูปภาพงานก่อผนัง ชั้นที่ 3



รูปภาพงานเดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร


# งบประมาณ

รายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบผูกพัน)


- 15.บริหารสัญญา
- 14.ส่งสำเนาสัญญา
- 13. ลงนามในสัญญา
- 12.เว้นระยะอุธรณ์
- 11.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
- 10. อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- 9.การพิจารณาเสนอราคา
- 8.ผู้เสนอราคาเสนอราคา
- 7.กำหนดวันชี้แจง
- 6.ส่งประกาศ
- 5.เผยแพร่ประกาศ
- 4.จัดทำรายงานเผยแพร่
- 3.จัดทำรายงานขอซื้อ
- 2.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- 1.จัดทำแผนจัดซื้อ

15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1



ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง  
4 ชั้น

ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 20 พ.ค. 65





งวดงาน	งวดเงิน	ตามแผนในสัญญาแล้วเสร็จ	ตามแผนคาดการณ์ใหม่	ส่งงานจริง	เบิกจ่าย(จริง)	ระยะล่าช้ากว่าแผน
1	4,792,796.00	16 ก.ค. 64	20 มี.ค. 65	20 พ.ค. 65	3,813,480.43	เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันล่าช้ากว่าแผน 60.44%
2	2,512,728.00	25 ส.ค. 64	20 เม.ย. 65	-	0	
3	1,954,344.00	1 ต.ค. 64	20 พ.ค. 65	-	0	
4	2,605,792.00	13 พ.ย. 64	20 มิ.ย. 65	-	0	
5	2,838,452.00	23 ธ.ค. 64	20 ก.ค. 65	-	0	
6	3,210,708.00	1 ก.พ. 65	15 ส.ค. 65	-	0	
7	2,233,536.00	13 มี.ค. 65	20 ก.ย. 65	-	0	
8	3,024,580.00	22 เม.ย. 65	30 ต.ค.65	-		
9	5,490,776.00	1 มิ.ย. 65	10 ธ.ค.65	-		
10	8,748,016.00	21 ก.ย. 65	20 ม.ค. 66	-		
11	9,120,272.00	9 ก.ย. 65	28 ก.พ. 66	-		

อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง  
เริ่มสัญญา 26 เมษายน 2564  
สิ้นสุด 9 กันยายน 2565

รวมงบประมาณ 46,532,000.00 บาท  
เบิกจ่ายแล้ว 3,813,480.43 บาท




ผลงานความก้าวหน้า 17.26 %  
ช้ากว่าแผน 60.44 %  
ระยะเวลาดำเนินการ 500 วัน  
ดำเนินการมาแล้ว 451 วัน  
คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง 49 วัน

# วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ระยะเวลาสัญญา	เริ่มดำเนินการจริงของผู้รับจ้าง	ปัญหาความล่าช้า	หมายเหตุ
๒. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๔ ชั้น	๑๗ พ.ค.๖๔ - ๙ ก.ย.๖๕	๑๘ พ.ค.๖๔ - ปัจจุบัน	๑.มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศ-คนงาน	๑.ปัจจุบัน พรจ.ส่งมอบงานถึงงวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ  ๒.พรจ.ส่งงวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ กำหนดการตรวจงานจ้าง วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕



# วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๔ ชั้น

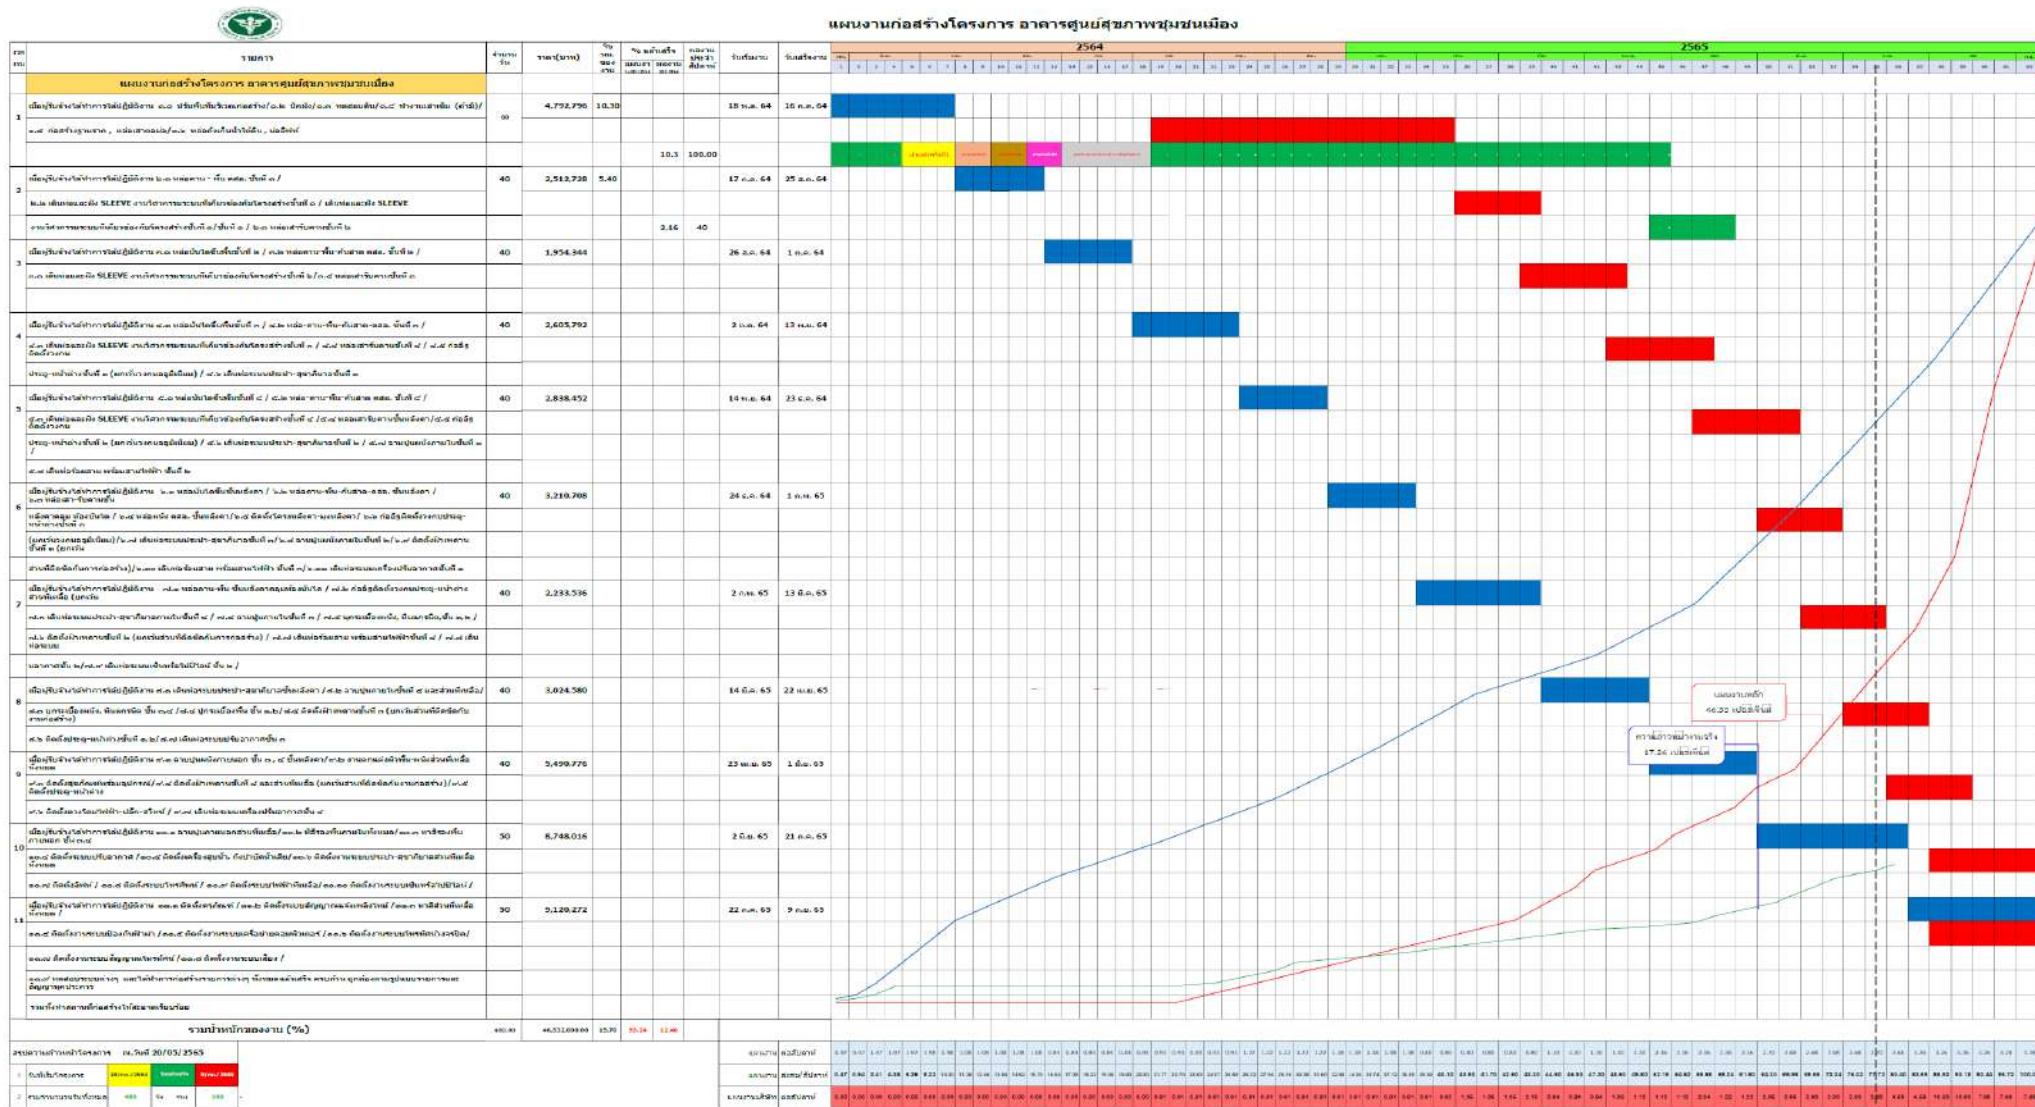

# วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง

ปริมาณรวม	วันที่ 17/05/64 – 20/7/65		
	ความก้าวหน้าแผนตามสัญญา (%)	ความก้าวหน้าตามแผน ผ.ร.จ. (%)	ความก้าวหน้าตามงานจริง (%)
	77.70	43.10	17.26

# วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๔ ชั้น



สรุปความก้าวหน้าโครงการ

รูปภาพประกอบการทำงานงวดงานที่ 2



# วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๔ ชั้น



รูปภาพงานเทเสาชั้นที่ 1



รูปภาพงานปัจจุบัน งานคาน, พื้นชั้นที่ 2

# วิเคราะห์ผลการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๔ ชั้น

ทางผู้รับจ้างได้แจ้ง จะส่งงานงวดงานที่ 3 19.90% ภายในเดือน สิงหาคม 2565

3.1 หล่อบันไดขึ้นพื้นชั้นที่ 2


3.2 หล่อคาน-พื้น-กันสาด คสล.ชั้นที่2

3.3 เดินท่อและฝัง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างชั้นที่ 2

3.4 หล่อเสารับคานชั้นที่ 3

ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 20-30วัน





# รายงานความก้าวหน้า การจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

- ครุภัณฑ์

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

# งบประมาณ

## รายการครุภัณฑ์ งบประมาณ

### ประจำปีงบประมาณ 2565 (e-bidding) 1 รายการ

15.บริหารสัญญา

14.ส่งสำเนาสัญญา

13. ลงนามในสัญญา

12.เว้นระยะอุธรณ์

11.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

10. อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

9.การพิจารณาเสนอราคา

8.ผู้เสนอราคาเสนอราคา

7.กำหนดวันชี้แจง

6.ส่งประกาศ

5.เผยแพร่ประกาศ

4.จัดทำรายงานเผยแพร่

3.จัดทำรายงานขอซื้อ

2.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

1.จัดทำแผนจัดซื้อ

15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1



เครื่อง X'Ray ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวน  
เพดานดิจิทัล 1 จอรับภาพ (ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

# งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 11 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคารวม
1	เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน	1	3,500,000.-
2	โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี	1	1,450,000.-
3	ยูนิตทำฟัน	2	920,000.-
4	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	6	900,000.-
5	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง	1	800,000.-
6	กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก	1	730,000.-
7	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้	1	450,000.-
8	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (Pre-Post Vac)	1	300,000.-
9	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้	1	175,000.-
10	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่าเอ 4	1	120,000.-
11	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	1	55,000.-

# งบบค่าเสื่อม

# รายการครุภัณฑ์ งบบค่าเสื่อม

## ประจำปีงบประมาณ 2565 (e-bidding) 6 รายการ



1. เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน  
จำนวน 1 เครื่อง (ส่งมอบและเบิกเงินแล้ว)

2. เครื่องช่วยหายใจในชนิดควบคุมด้วยปริมาตร  
ลดความดัน ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง (ส่งมอบและเบิกเงินแล้ว)

3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ  
และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 6 เครื่อง (ส่งมอบและเบิกเงินแล้ว)

4. ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง (ส่งมอบและเบิกเงินแล้ว)

5. กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก  
จำนวน 1 เครื่อง (ส่งมอบและเบิกเงินแล้ว)

6. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า  
130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง (รอส่งมอบ)

## ประจำปีงบประมาณ 2565 (วิธีเฉพาะเจาะจง) 5 รายการ

10.บริหารสัญญา

9.ส่งสำเนาสัญญา

8. ลงนามในสัญญา

7.เรียกลงนามในสัญญา

6.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

5. อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

4.ผู้เสนอราคาเสนอราคา

3.จัดทำรายงานขอซื้อ

2. จัดทำรายงานสเปคฯ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง (ส่งมอบและเบิกเงินแล้ว)

2. ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง (ส่งมอบและเบิกเงินแล้ว)

3. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าเอ 4 จำนวน 6 เครื่อง (ส่งมอบและเบิกเงินแล้ว)

4. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย จำนวน 1 เครื่อง (ส่งมอบและเบิกเงินแล้ว)

5 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (Pre-Post Vac) จำนวน 1 เครื่อง (ส่งมอบและเบิกเงินแล้ว)



# งบเงินกู้โควิดฯ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคารวม
1	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง	5	17,950,000.-
2	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 300 mA.	2	10,276,000.-
3	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลชนิดน้ำหนักเบา	2	7,000,000.-
4	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	20	4,000,000.-
5	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง	2	1,598,000.-
6	กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ	1	999,000.-

# งบเงินกู้

## รายการครุภัณฑ์ งบเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (e-bidding)

อำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จำนวน 2 รายการ

15.บริหารสัญญา

14.ส่งสำเนาสัญญา

13. ลงนามในสัญญา (1 วัน)

12.เว้นระยะอุทธรณ์ (7 วัน)

11.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (3 วัน)

10. อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

9.การพิจารณาเสนอราคา

8.ผู้เสนอราคาเสนอราคา

7.กำหนดวันชี้แจง

6.ส่งประกาศ/เอกสารฯ สดง.

5. เผยแพร่ประกาศ (3 วัน)

4.จัดทำรายงานเผยแพร่

3.1 กรณีเผยแพร่ร่างประกาศ (3 วัน)

3.จัดทำรายงานขอซื้อ

2.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

1.จัดทำแผนจัดซื้อ

Timeline เดิม

11/ก.ค./65

27 มิ.ย -1 ก.ค./65

22 มิ.ย-24 มิ.ย./65

15-21/มิ.ย./65

14/มิ.ย./65

9-13/มิ.ย./65

7-8/มิ.ย./65

1 มิ.ย.- 6 มิ.ย./65

17-18/มี.ค./65

10-16/มี.ค./65

9/มี.ค./65

Timeline ใหม่ มีวิจารณ์ร่าง  
ประกาศประกวดฯ ครั้งที่ 2

6/ก.ย./65

26 ส.ค.-5 ก.ย./65

25/ส.ค./65

16-24/ส.ค./65

15/ส.ค./65

9-11/ส.ค./65

4-8/ส.ค./65

1-3/ส.ค./65

1. เครื่อง X'Ray เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า  
300 mA 2 เครื่อง (รอส่งมอบพัสดุ)

2. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ  
และสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ 5  
เครื่อง (อยู่ระหว่างพิจารณาผลการขึ้น  
ร่างประกาศฯ เนื่องจากมีผู้สนใจร่วม  
วิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

# งบเงินกู้

## รายการครุภัณฑ์ **งบเงินกู้** ประจำปีงบประมาณ 2565 (e-bidding) อำนาจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 4 รายการ

15.บริหารสัญญา

14.ส่งสำเนาสัญญา

13. ลงนามในสัญญา (1 วัน)

12.เว้นระยะอุทธรณ์ (7 วัน)

11.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

10. อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

9.การพิจารณาเสนอราคา (5)

8.ผู้เสนอราคาเสนอราคา

7.กำหนดวันชี้แจง

6.ส่งประกาศ/เอกสารฯ สดง.

5. เผยแพร่ประกาศ (3 วัน)

4.จัดทำรายงานเผยแพร่

3.1 กรณีเผยแพร่ร่างประกาศ (3 วัน)

3.จัดทำรายงานขอซื้อ

2.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

1.จัดทำแผนจัดซื้อ

1. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง  
จำนวน 20 เครื่อง (เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร  
และความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง (รอส่งมอบพัสดุ)

3 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลชนิดน้ำหนักเบา  
จำนวน 2 เครื่อง (นัดส่งมอบพัสดุ 27ก.ค. 65)

4 กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้  
ชนิดวีดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ  
เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจ  
และใส่ท่อหายใจ จำนวน 1 เครื่อง (รอส่งมอบพัสดุ)

THANK YOU

